

**R区画擁壁 土砂の噴出を抑制するフィルター装着工事の実施について  
 (ご報告)**

昨今の集中豪雨の影響により、R区画では擁壁の水抜き穴を通じて、土砂と雨水が墓地区画内に噴出し、墓石に降り掛かる事案が発生していました。

このたび、土砂の噴出を抑制するためにフィルターを装着する工事を実施しましたので、ご報告いたします。

この間、ご迷惑をおかけしたご使用者様には、心よりお詫び申し上げます。なお、当面、今回の工事の効果を検証することとし、必要があれば更なる対策を講じてまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

**【工事の概要】**

- ・水抜き穴の土砂の除去
- ・水抜き穴の詰まりを防ぐ対策
  - ① 塩ビ管…フィルターの装着
  - ② 擁壁（山側）…土砂の除去と砕石による埋め戻し

対策前




対策後



① フィルター装着(塩ビ管内奥)

工事箇所

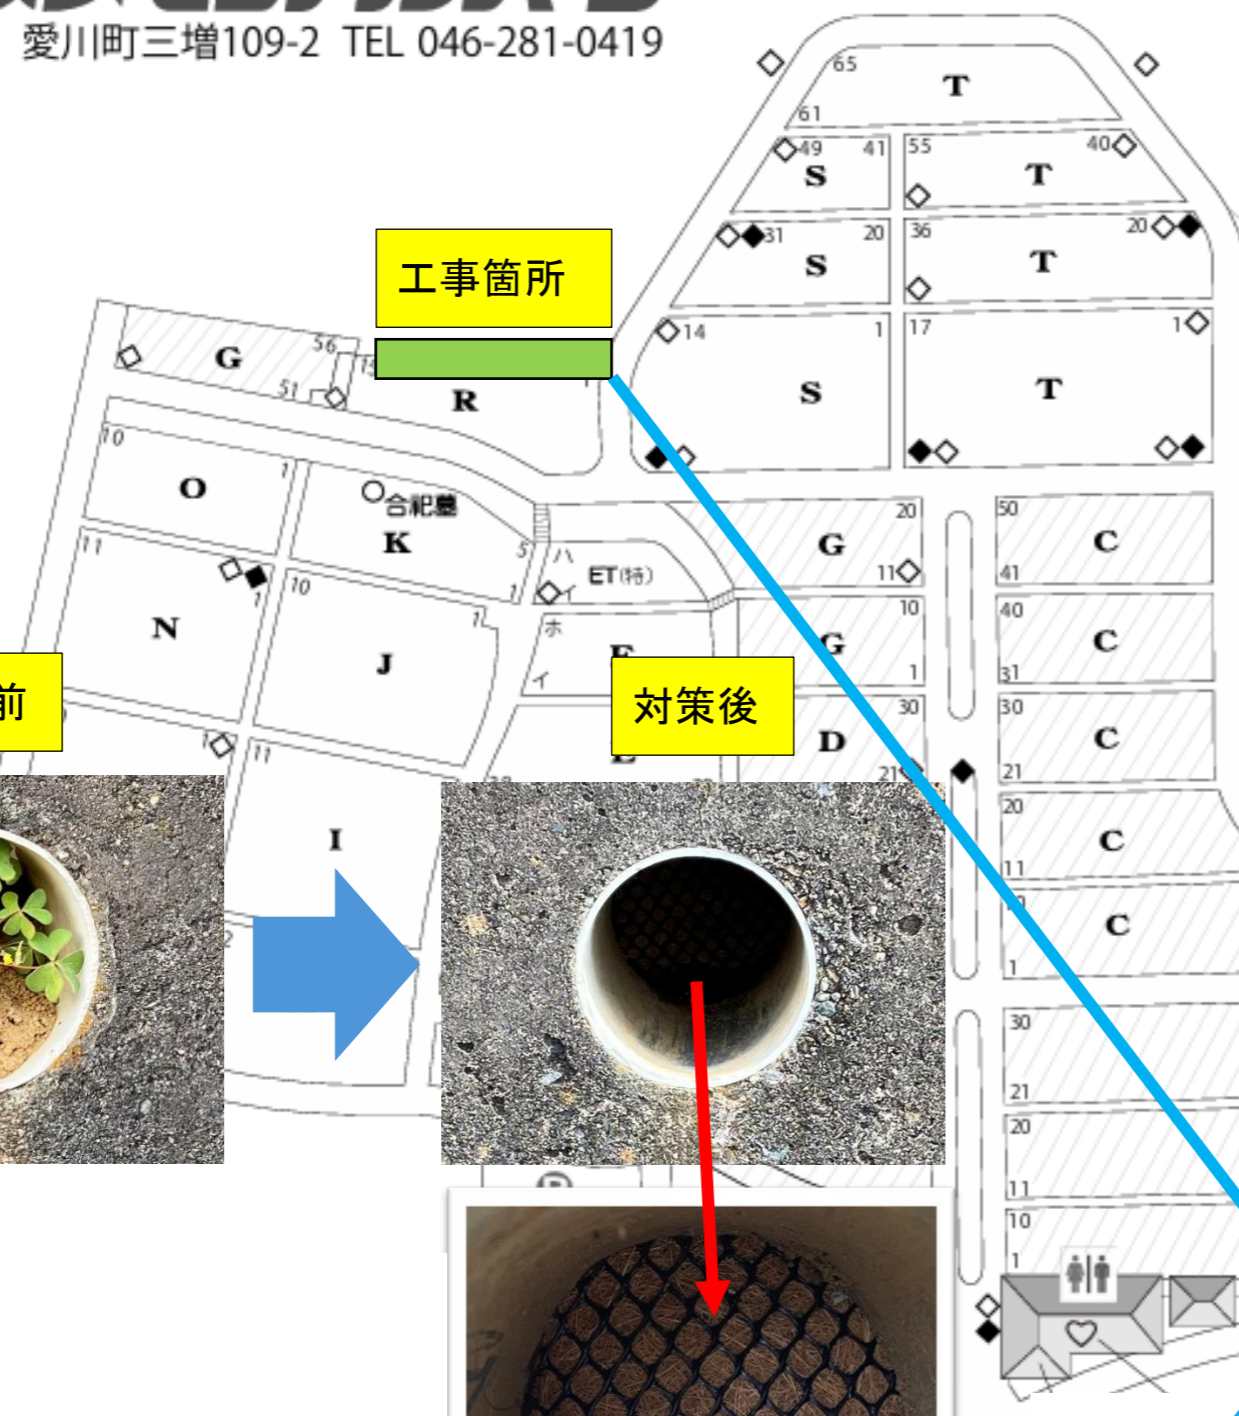

② 土砂除去・砕石埋め戻し

